

SAE - Servicio de Acreditación Ecuatoriano
Coordinación General Técnica
Dirección de Certificación

PROYECTO: K001 SAE - Mejorar la Infraestructura de la Calidad en el Marco de los Ejes de la Agenda Regulatoria

Líder del Proyecto:	Maya Izurieta, Néstor Xavier (nmaya@acreditacion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	ZAPATA MALDONADO, JOHANA PAOLA	Programas Relacionados:	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN EL MARCO DE LOS EJES DE LA AGENDA REGULATORIA
Titular:	Romo Orbe, Miriam Janneth	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	154750000.0000.377044	TIR:	15.20 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	2,168,998.57
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,099,056.36
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	04/10/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Altuna Hidalgo, Milton Herminio	Fecha del siguiente Hito:	31/10/2016

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

***DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

el proyecto estará dirigido a las cadenas productivas priorizadas con mayor énfasis en el sector industrial, y encaminado a respaldar al productor y a la producción nacional a través de tres componentes principales:

- . Desarrollo de un sistema de alertas.
- . Acreditación estratégica dirigida a los sectores de las cadenas productivas priorizadas.
- . Vigilancia del mercado y Servicios Públicos.

En conclusión el presente proyecto está encaminado a apoyar a tres de los cinco objetivos de la Agenda Regulatoria que son:

- . Sustitución de importaciones
- . Consumo para el buen vivir
- . Diversificación de exportaciones

Objetivos altamente importantes para reducir la gran brecha existente en la balanza comercial del país. Esto se lo puede lograr justamente sustituyendo las importaciones que ingresan al país; apoyando al productor ecuatoriano con tecnología, capacitación, la diversificación de la oferta de productos y servicios orientados a satisfacer la demanda nacional y lograr nuevos mercados en el contexto internacional.

***PRODUCTO/SERVICIO:**

- . 100% certificados verificados
- . 1 sistema de alerta implementado
- . 303 OEC acreditados y reconocidos
- . 577 acreditaciones y reconocimientos por campo
- . 10 reguladores aplicando esquemas de inspección para vigilancia del mercado

***LINEA BASE:**

- 131 Organismos de Evaluación de la Conformidad Acreditados
- 339 acreditaciones por campo

***OBJETIVO GENERAL:**

Fortalecer la infraestructura de la calidad del país con organismos de evaluación de la conformidad acreditados, que apoyen en el control y vigilancia a las autoridades reguladoras para garantizar que los productos y servicios nacionales e importados cumplan los requerimientos de calidad.

***OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

DATOS GENERALES

Descripción

. Desarrollar un sistema de alertas, que permita un control del cumplimiento de normas y estándares de calidad y seguridad.
 . Acreditar estratégicamente a los organismos de evaluación de la conformidad que apoyen a los sectores de las cadenas productivas prioritizadas.
 . Apoyar la Vigilancia del mercado con organismos externalizados para la protección de los intereses públicos como la salud, la alimentación, la seguridad en general, el medio ambiente, entre otros.

Beneficios Cualitativos

Proveer al industrial ecuatoriano de Organismos de evaluación de la conformidad acreditados que faciliten la producción de bienes y servicios de calidad y el acceso a mercados.
 Garantizar al consumidor bienes y servicios seguros para su salud con altos estándares de calidad.

Tipo de Beneficiario

La población objetivo son las autoridades reguladoras, los organismos de evaluación de la conformidad y las unidades productivas.
 - 10 Autoridades Reguladoras:
 - 303 Organismos de evaluación de la conformidad
 - 15.000 Unidades productivas

Restricciones

TIEMPO: 48 MESES

COSTO:

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.330.568,201.081.826,131.086.826,131.037.326,134.536.546,58				

ALCANCE:

Desarrollar un sistema de alertas.

Este sistema está encaminado a permitir un control de cumplimiento de normas ecuatorianas de productos que se comercializan en el mercado ecuatoriano. Y de no cumplirlos proceder a las sanciones y devoluciones respectivas, todo ello con el fin de garantizar la salud y seguridad de los ecuatorianos a través del consumo de productos que cumplan requisitos de calidad y seguridad.

Para el desarrollo del Sistema de alertas la institución cuenta con la infraestructura adecuada que cumplirá con el alojamiento del sistema así como su comunicación permanente en alta disponibilidad; la infraestructura existente se compone de servidores de alto rendimiento, sistemas operativos Open Source, una red de datos mixta es decir inalámbrica y por medio de cableado estructurado, sistema de comunicación telefónico IP para atención al cliente.

Frente a la infraestructura tecnológica existente para llevar a cabo el proyecto se requiere: infraestructura para respaldo de información que pueda proporcionar los servicios ofrecidos por la institución en un eventual acontecimiento de daño permanente a los equipos existentes. El equipo y software tecnológico a adquirir es el siguiente:

.2 Servidores para Sistema de Virtualización VMware (aplicaciones web, correos, firewall, aplicaciones propias de la institución), Switch SAN (Fibra Optica), Console Switch, rack, comunicaciones, instalación y soporte.

.Software de escritorio. Licencias Microsoft Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft Visio.

El monto asignado para esta actividad contempla la compra de infraestructura tecnológica, contratación de servicio de mantenimiento de equipo tecnológico, compra y renovación de licencias antivirus, Microsoft office, Windows, proyect y visio, los cuales se contratarán a través de procesos de compras públicas como: Infima cuantía, subasta inversa y de menor cuantía. El valor fue estimado en base a adquisiciones y contrataciones anteriores.

Además, para el desarrollo de este componente se requiere:

Contratar una consultoría para levantamiento de procesos. Esta contratación se la realizará por consultoría contratación directa a través del portal del Servicio de Contratación Pública con todas las normas vigentes dadas para este caso.

Contratar el análisis, desarrollo, implementación y puesta en producción del sistema de alertas, contratación que se realizará mediante proceso de compras públicas "consultoría lista corta" previa autorización de la Subsecretaría de Informática SI. El valor asignado para esta actividad considera el número de desarrolladores, administrador del proyecto de la empresa contratada, un experto en base de datos, documentadores, capacitadores y sobre todo el tiempo de entrega del sistema a desarrollar por ser un compromiso presidencial. Las experiencias anteriores de desarrollo de software avaladas y autorizadas por la SI, han sido también base fundamental en la estimación de los valores.

Acreditación estratégica dirigida a los sectores de las cadenas productivas prioritizadas

La acreditación tiene por objeto aumentar la confianza, que la sociedad tiene de la información que proporcionan los organismos de evaluación de la conformidad OEC's, tanto nacional como internacionalmente y es el procedimiento a través del cual se confiere a los OEC's un reconocimiento formal de su competencia técnica para llevar a cabo tareas específicas de evaluación de la conformidad como: ensayos, calibraciones, certificaciones e inspecciones.


RECURSOS:

El proyecto trae consigo nuevas actividades y responsables para el OAE, razón por la cual es necesaria la contratación de personal que permita su cumplimiento. Total de personal requerido 37

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 68.93 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

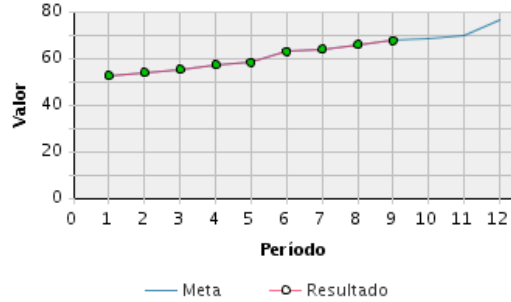

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	53 %	54 %	55 %	57 %	58 %	63 %	64 %	66 %	67 %	68 %	69 %	77 %
	Avance real acumulado											
	53 %	54 %	55 %	57 %	58 %	63 %	64 %	66 %	67 %			
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se atendió el 100% de los certificados ingresados (Hito relacionado 95 EJECUCIÓN: III Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 102 EJECUCIÓN: III Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas) Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 88 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas) Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 89 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas) Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas Se realizó la revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos) (hito relacionado 90) 	Altuna Hidalgo, Milton Herminio	04/10/2016 - 09:26 AM
<p>AGOSTO 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Se atendió el 100% de los certificados ingresados (Hito relacionado 95 EJECUCIÓN: III Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 102 EJECUCIÓN: III Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas) Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 84 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas) Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 85 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas) Se realizó la revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos) (hito relacionado 86) Se realizó la evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos (hito relacionado 87) Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas 	Altuna Hidalgo, Milton Herminio	05/09/2016 - 09:42 AM
<p>JULIO 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se atendió el 100% de los certificados ingresados (Hito relacionado 95 EJECUCIÓN: III Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) 	Altuna Hidalgo, Milton Herminio	03/08/2016 - 12:23 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 102 EJECUCIÓN: III Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas)</p> <p>3. Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 82 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas)</p> <p>4. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 83 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas)</p> <p>5. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas</p>		
<p>JUNIO 2016:</p> <p>1. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (Hito relacionado 95 EJECUCIÓN: III Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados)</p> <p>2. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 102 EJECUCIÓN: III Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas)</p> <p>3. Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 77 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas)</p> <p>4. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 78 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas)</p> <p>5. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas</p> <p>6. Se realizó la revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos) (hito relacionado 79)</p> <p>7. Se ha alcanzado 23 OEC acreditados y reconocidos (Hito relacionado 80 EJECUCIÓN: III Fase - OEC acreditados y reconocidos (22)</p> <p>8. Se ha alcanzado 117 Acreditaciones y reconocimientos por campo (Hito relacionado 81 EJECUCIÓN: III Fase - Acreditaciones y reconocimientos por campo realizados (39)</p>	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>07/07/2016 - 05:12 PM</p>
<p>MAYO 2016:</p> <p>1. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (Hito relacionado 95 EJECUCIÓN: III Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados)</p> <p>2. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 102 EJECUCIÓN: III Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas)</p> <p>3. Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 75 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas)</p> <p>4. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 76 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas)</p> <p>5. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas</p>	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>02/06/2016 - 11:22 AM</p>
<p>ABRIL 2016:</p> <p>1. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (Hito relacionado 95 EJECUCIÓN: III Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados)</p> <p>2. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 102 EJECUCIÓN: III Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas)</p> <p>3. Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 71 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas)</p> <p>4. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 72 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas)</p> <p>5. Se realizó la revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos) (hito relacionado 73)</p> <p>6. Se realizó la evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos (hito relacionado 74)</p> <p>7. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas</p>	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>05/05/2016 - 11:54 AM</p>
<p>MARZO 2016:</p> <p>1. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (Hito relacionado 95 EJECUCIÓN: III Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados)</p> <p>2. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 102 EJECUCIÓN: III Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas)</p> <p>3. Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 66 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas)</p>	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>05/04/2016 - 12:56 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 67 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas)</p> <p>5. Se realizó la revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos) (hito relacionado 70)</p> <p>6. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas</p>		
<p>FEBRERO 2016:</p> <p>1. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (Hito relacionado 95 EJECUCIÓN: III Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados)</p> <p>2. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 102 EJECUCIÓN: III Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas)</p> <p>3. Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 66 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas)</p> <p>4. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 67 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas)</p> <p>5. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas</p>	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>03/03/2016 - 03:27 PM</p>
<p>ENERO 2016:</p> <p>1. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (Hito relacionado 95 EJECUCIÓN: III Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados)</p> <p>2. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 102 EJECUCIÓN: III Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas)</p> <p>3. Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 64 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas)</p> <p>4. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 65 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas)</p> <p>5. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas</p>	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>05/02/2016 - 01:07 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2015:</p> <p>1. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (167) (Hito relacionado 51 EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados)</p> <p>2. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 52 EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas)</p> <p>3. Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 53 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas)</p> <p>4. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 54 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas)</p> <p>5. Se generó un informe de acciones correctivas tomadas por las autoridades reguladoras (hito relacionado 55 EJECUCIÓN (Seguimiento): Reporte de informes de acciones correctivas tomadas por las autoridades reguladoras ejecutado)</p> <p>6. las Direcciones Técnicas realizaron la revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos) (hito relacionado 56 EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)</p> <p>7. las Direcciones Técnicas realizaron la evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos ejecutada (hito relacionado 57 EJECUCIÓN : Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos ejecutada)</p> <p>8. las Direcciones Técnicas realizaron la revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada(acreditados y reconocidos) (hito relacionado 58 EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos)</p> <p>9. Se ha alcanzado 23 (211 acum) OEC acreditados y reconocidos (Hito relacionado 59 EJECUCIÓN: II Fase - OEC acreditados y reconocidos (18)</p> <p>10. Se cumplió con la II fase de mantenimiento de equipo tecnológico (Hito relacionado 60 EJECUCIÓN: II Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada)</p> <p>11. Se ha alcanzado 661 (551 acum) Acreditaciones y reconocimientos por campo (Hito relacionado 61 EJECUCIÓN: II Fase - Acreditaciones y reconocimientos por campo realizados (22)</p> <p>12. Autoridades reguladoras han aplicado esquemas de inspección para vigilancia de mercados (Hito relacionado 62 EJECUCIÓN: II Fase - Autoridades reguladoras aplicando esquemas de inspección para vigilancia de mercados (4 acumulado)</p>	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>05/01/2016 - 04:24 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>13. Se han realizado (26) eventos de capacitación en nuevos esquemas de acreditación (hito relacionado 63 EJECUCIÓN: II Fase - Capacitación en nuevos esquemas de acreditación ejecutada)</p>		
<p>NOVIEMBRE 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha generado un reporte de Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 49 EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas 2. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 50 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas) 3. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (156) (Hito relacionado 51 EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) 4. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas 5. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 52 EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas). 6. Se realizó la fase de mantenimiento programada (hito relacionado 60 EJECUCIÓN: II Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada). 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>02/12/2015 - 11:19 AM</p>
<p>OCTUBRE 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (227) (Hito relacionado 51 EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) 2. Se ha generado un reporte de Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 47 EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas 3. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 48 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas) 4. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas 5. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 52 EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas) 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>04/11/2015 - 05:15 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (184) (Hito relacionado 51 EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) 2. Se ha generado un reporte de Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 44 EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas 3. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 45 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas) 4. las Direcciones Técnicas realizaron la revisión de solicitudes iniciales y de ampliación (acreditados y reconocidos) (hito relacionado 46 EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos) 5. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas 6. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 52 EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas) 7. Se adquiere la infraestructura tecnológica de respaldo, 1 servidor y 2 discos para reemplazar los alertados. (hito relacionado 6 EJECUCIÓN: Infraestructura tecnológica de respaldo adquirida). 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>05/10/2015 - 03:56 PM</p>
<p>AGOSTO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó actividad de mantenimiento pendiente (hitos relacionados 15 y 60 EJECUCIÓN: I y II Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada 2. Se realizó la actividad pendiente: 20% de renovación de licencias de antivirus y se compraron las que faltaban para la institución. 3. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (189) (Hito relacionado 51 EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) 4. Se ha generado un reporte de Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 39 EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas 5. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 40 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas) 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>04/09/2015 - 10:27 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6. las Direcciones Técnicas realizaron la revisión de solicitudes iniciales (acreditados y reconocidos) (hito relacionado 41 EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)</p> <p>7. las Direcciones Técnicas realizaron la Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos (hito relacionado 42 EJECUCIÓN : Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos ejecutada</p> <p>8. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas</p> <p>9. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 52 EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas)</p> <p>10. Se realizaron 2 campañas de difusión y promoción de la acreditación (una fue pendiente del año 2014) (Hito relacionado 10 y 43 EJECUCIÓN: I y II Campaña Difusión y promoción realizada</p>		
<p>JULIO 2015:</p> <p>1. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (231) (Hito relacionado 51 EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados)</p> <p>2. Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 37 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas)</p> <p>3. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 38 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas)</p> <p>4. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 52 EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas)</p>	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>04/08/2015 - 04:48 PM</p>
<p>JUNIO 2015:</p> <p>1. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (360) (Hito relacionado 51 EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados)</p> <p>2. Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 31 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas)</p> <p>3. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 32 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas)</p> <p>4. Se generó un informe de acciones correctivas tomadas por las autoridades reguladoras (hito relacionado 33 EJECUCIÓN (Seguimiento): Reporte de informes de acciones correctivas tomadas por las autoridades reguladoras ejecutado</p> <p>5. las Direcciones Técnicas realizaron la revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada(acreditados y reconocidos) (hito relacionado 34 EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos)</p> <p>6. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 52 EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas)</p> <p>7. Se ha alcanzado 17 (188 acum) OEC acreditados y reconocidos (Hito relacionado 35 EJECUCIÓN: II Fase - OEC acreditados y reconocidos (18)</p> <p>8. Se ha alcanzado 70 (483 acum) Acreditaciones y reconocimientos por campo (Hito relacionado 36 EJECUCIÓN: II Fase - Acreditaciones y reconocimientos por campo realizados (20)</p> <p>9. Se han realizado 20 eventos de capacitación en nuevos esquemas de acreditación (hito relacionado 63 EJECUCIÓN: II Fase - Capacitación en nuevos esquemas de acreditación ejecutada)</p>	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>06/07/2015 - 01:51 PM</p>
<p>ABRIL 2015:</p> <p>1. Se realizará 1 actividad de mantenimiento (hito relacionado 60 EJECUCIÓN: II Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada</p> <p>2. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (262) (Hito relacionado 51 EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados)</p> <p>3. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 26 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas)</p> <p>4. las Direcciones Técnicas realizaron la revisión de solicitudes iniciales (acreditados y reconocidos) (hito relacionado 27 EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)</p> <p>5. las Direcciones Técnicas realizaron la Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos (hito relacionado 28 EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)</p> <p>4. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas</p> <p>5. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 52 EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas)</p>	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>19/06/2015 - 10:42 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizará 1 actividad de mantenimiento (hito relacionado 60 EJECUCIÓN: II Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada) Se atendió el 100% de los certificados ingresados (Hito relacionado 51 EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 30 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas) Se ha generado un reporte de alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 29 EJECUCIÓN: alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas) Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 52 EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas) 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>05/06/2015 - 05:35 PM</p>
<ol style="list-style-type: none"> Se realizará 1 actividad de mantenimiento (hito relacionado 60 EJECUCIÓN: II Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada) Se atendió el 100% de los certificados ingresados (262) (Hito relacionado 51 EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 26 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas) las Direcciones Técnicas realizaron la revisión de solicitudes iniciales (acreditados y reconocidos) (hito relacionado 27 EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos) las Direcciones Técnicas realizaron la Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos (hito relacionado 28 EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos) Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 52 EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas) 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>07/05/2015 - 04:23 PM</p>
<p>MARZO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizaron 3 actividades de mantenimiento preventivo, computadores HP, DELL, impresora Lexmark (hito relacionado 60 EJECUCIÓN: II Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada) Se atendió el 100% de los certificados ingresados (209) (Hito relacionado 51 EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) Se ha generado un reporte de Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 22 EJECUCIÓN : Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas) Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 23 EJECUCIÓN: Alertas para análisis identificadas) las Direcciones Técnicas realizaron la revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada(acreditados y reconocidos) (hito relacionado 24 SEGUIMIENTO: revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada) Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 52 EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas) 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>05/04/2015 - 06:31 PM</p>
<p>FEBRERO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se atendió el 100% de los certificados ingresados (209) (Hito relacionado 51 EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) Se ha generado un reporte de Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado 20 SEGUIMIENTO: Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas) Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado 21 SEGUIMIENTO: Alertas para análisis identificadas) Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado 52 EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas) 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>05/03/2015 - 08:37 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se realizó el mantenimiento de equipo tecnológico. Se reformuló la planificación acorde a las reformas presupuestarias previstas en enero 2015. (Hito relacionado EJECUCIÓN: II Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada) 2. Se atendió el 100% de los certificados ingresados (184) (Hito relacionado EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) 3. Se ha generado un reporte de alertas para análisis identificadas (hito relacionado SEGUIMIENTO: Alertas para análisis identificadas) 4. Se ha generado un reporte de Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas (hito relacionado SEGUIMIENTO: Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas) 5. Se ha realizado el porcentaje programado para la Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas 6. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas) 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>19/02/2015 - 04:20 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se han acreditado y reconocido 40 OEC (Hito relacionado EJECUCIÓN: I Fase OEC acreditados y reconocidos) 2. No se realizó la campaña de difusión se considera realizar las campañas programadas para el siguiente año. (Hito relacionado EJECUCIÓN: I Campaña Difusión y promoción realizada) 3. Hasta diciembre 2014 se tienen 4093 certificados verificados (Hito relacionado EJECUCIÓN: I Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) 4. Se ha alcanzado 74 Acreditaciones y reconocimientos por campo (Hito relacionado EJECUCIÓN: I Fase - Acreditaciones y reconocimientos por campo realizados (37)) 5. 9 autoridades reguladoras se encuentran aplicando esquemas de inspección (Hito relacionado EJECUCIÓN: I Fase - Autoridades reguladoras aplicando esquemas de inspección para vigilancia de mercados (2)) 6. Se han realizado los siguientes eventos de capacitación: <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación a funcionarios del ministerio de Ambiente en esquemas de seguridad ambiental (octubre) - Capacitación al personal del SAE en esquemas de acreditación para servicios sociales en el campo de CIBV y discapacidades. Inspección - Capacitación otorgada conjuntamente con el MIES sobre normativas para servicios para personas con discapacidad - Participación en el plan piloto para las matrices de licenciamiento en los centros de análisis - Capacitación práctica conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública para inspección de centros de salud (hito relacionado EJECUCIÓN: I Fase - Capacitación en nuevos esquemas de acreditación ejecutada) 7. Actividad reprogramada par el año 2015 (hito relacionado EJECUCIÓN: I Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada) 8. Se han realizado y se ha participado en diferentes eventos encaminados a promover el interés de los OEC (hito relacionado EJECUCIÓN: I Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas) 9. Se ha generado un reporte de acciones correctivas (hito relacionado SEGUIMIENTO: Reporte de informes de acciones correctivas tomadas por las autoridades reguladoras generado (1 reporte)) 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>19/02/2015 - 03:30 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Está aceptado el 99% del producto en pre-producción, se ha generado proceso de socialización a las autoridades de control. (hito relacionado EJECUCIÓN: Esquema de coordinación, administración y seguimiento del sistema de alertas desarrollado) 2. Se ha realizado la verificación de 167 certificados de productos sujetos a control para importación (hito relacionado EJECUCIÓN: I Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) 3 Se levantaron, aprobaron y publicaron TDR de acuerdo a formato solicitado por Asesoría Jurídica. El trámite no pasó al proceso de compra ya que proveedores no cumplían con pliegos. Queda el proceso listo para lanzarlo en el 2015. (hito relacionado EJECUCIÓN: Infraestructura tecnológica de respaldo adquirida) 4. Se realizaron actividades de control y seguimiento a todo el proyecto (hito relacionado SEGUIMIENTO: Reporte de seguimiento y monitoreo al proyecto mensual 6) 5. Proyectos de vigilancia de cumplimiento de las normas técnicas de: <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspección técnica del Teleferico de Quito. Archivo: Quito Turismo Archivo: Oficio OAE DI 14-158. 2. Inspección de los Centros Infantiles del Buen Vivir. Archivo: Instructivo CIBV. 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>01/12/2014 - 05:46 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3. Inspección de en la Norma de Centro de Atención de Discapacidades. 4. Inspección de la Norma de Centros y Servicios Grontrologicos. 5. Inspección en la Norma de Desarrollo Infantil Integral. 6. Inspección en la Norma de Erradicación del trabajo infantil y mendicidad. 7. Inspección en la Norma de Servicio en espacio juvenil. 8. Inspeccion en Norma Técnica de Proteccion Especial. 9. Inspección en la Norma de Desarrollo Infantil Integral modalidad Creciendo con nuestros hijos. (hito relacionado EJECUCIÓN: Propuestas de actividades de vigilancia del mercado con entidades acreditadas presentadas (20))</p>		
<p>OCTUBRE 2014:</p> <p>1. Se llevó a cabo la entrega y versionamiento del sistema de alertas por parte del proveedor, actualmente está en ambiente de pruebas (hito cumplido EJECUCIÓN: Sistema de alerta implementado) 2. Se ha desplegado la infraestructura del sistema de pruebas. Sde inician pruebas del sistema previa entrada a producción (hito relacionado EJECUCIÓN: Esquema de coordinación, administración y seguimiento del sistema de alertas desarrollado) 3. Se ha realizado la verificación de 239 certificados de productos sujetos a control para importación (hito relacionado EJECUCIÓN: I Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados) 4. SE han realizado convocatorias en Quito y Guayaquil encaminadas a promover el interés de los OEC (hito relacionado EJECUCIÓN: I Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas) 5. Se devolvieron los procesos por parte de la Dirección Jurídica argumentando que la formalización de todo el proceso no es correcta para lo cual indica se debe generar documentos iniciales de visionamiento y justificación de cada proceso. Indicar costos referenciales para que máxima autoridad autorice (hito relacionado EJECUCIÓN: Infraestructura tecnológica de respaldo adquirida) 6. Se licenciaron los equipos informáticos adquiridos y que son parte del proyecto (hito cumplido EJECUCIÓN: Adquisición y mantenimiento de licenciamiento de software de escritorio ejecutado) 7. Se realizaron actividades de control y seguimiento a todo el proyecto (hito relacionado SEGUIMIENTO: Reporte de seguimiento y monitoreo al proyecto mensual 5) 8. Proyectos de vigilancia de cumplimiento de las normas técnicas de: 1. Servicios Sociales Públicos 2. Establecimientos de hospedaje: 3. Inspección de servicios higiénicos en gasolineras. 4. Inspección de establecimientos de turismo de aventura 5. Inspección de servicios de salud: dispensarios de salud. 6. Inspección de servicios de salud: Centros de diálisis 7. Inspección de servicios de salud: Consultorios de Especialidades Médicas Nivel 1 8. Inspección de servicios de salud: Consultorios de Especialidades Médicas Nivel 2 9. Inspección de servicios de salud: Consultorios de Especialidades Médicas Nivel 3 10. Inspección de servicios de salud: Consultorios Odontológicos (hito relacionado EJECUCIÓN: Propuestas de actividades de vigilancia del mercado con entidades acreditadas presentadas (20))</p>	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>05/11/2014 - 07:00 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12.50 % Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas - 18.75% en la verificación de certificados de productos sujetos a control para importación - 24.24 % de actividades encaminadas a promover el interés de los OEC - 25 OEC acreditados y reconocidos - 38 acreditaciones y reconcoimientos por campo - 18.75% de actividades de monitoreo - 40% de infraestructura tecnológica de respaldo adquirida - 20% de licenciamiento del software de escritorio 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>21/10/2014 - 09:14 AM</p>
<p>AGOSTO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.33 % Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas - 16.67% en la verificación de certificados de productos sujetos a control para importación - 21.21 % de actividades encaminadas a promover el interés de los OEC - 25 OEC acreditados y reconocidos - 37 acreditaciones y reconcoimientos por campo - 16.66% de actividades de monitoreo - 20% de infraestructura tecnológica de respaldo adquirida - 10% de licenciamiento del software de escritorio 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>21/10/2014 - 09:11 AM</p>
<p>JULIO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.17 % Administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas - 12.50% en la verificación de certificados de productos sujetos a control para importación 	<p>Altuna Hidalgo, Milton Herminio</p>	<p>21/10/2014 - 09:07 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> - 100% de definición de productos o servicios claves en los que se requiera organismos de evaluación de la conformidad acreditados - 41 computadores (24 de escritorio, 12 portátiles, 5 minis) y una impresora - 18.18 % de actividades encaminadas a promover el interés de los OEC - 22 OEC acreditados y reconocidos - 32 acreditaciones y reconcoimientos por campo - 14.58% de actividades de monitoreo 		
JUNIO 2014: <ul style="list-style-type: none"> - 100% de avance en el levantamiento de procesos. - 100% en el desarrollo del esquema de coordinación, administración y seguimiento del sistema de alertas - 2430 certificados de productos sujetos a control para importación verificados - 50% de definición de productos o servicios claves en los que se requiera organismos de evaluación de la conformidad acreditados - 15.15 % de actividades encaminadas a promover el interés de los OEC - 20 OEC acreditados y reconocidos - 29 acreditaciones y reconcoimientos por campo - 100% de identificación de las autoridades que deben realizar vigilancia de mercados 	Altuna Hidalgo, Milton Herminio	14/08/2014 - 12:26 PM
MAYO 2014: El Ministerio de Finanzas asigna el presupuesto al OAE 21 de mayo, por lo que se ha reprogramado ejecución presupuestaria y de actividades para el año 2014. El monto asignado para el año 2014 es de 1.330.568,20	Altuna Hidalgo, Milton Herminio	22/07/2014 - 02:07 PM
MARZO 2014: la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo prioriza e incluye en el Plan Anual de Inversión 2014 este proyecto.	Altuna Hidalgo, Milton Herminio	22/07/2014 - 02:06 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. Recorte presupuestario por situación económica del país CAUSARÍA revisión de metas planteadas y/ o priorización de actividades a ejecutarse	03/08/2016	Néstor Xavier Maya Izurieta	40 %	70	28	0/1

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
2	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Autoridades que deben realizar vigilancia de mercados identificadas	9-Entregables Formales	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.51
2	EJECUCIÓN: Esquema de coordinación, administración y seguimiento del sistema de alertas desarrollado	9-Entregables Formales	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.51
3	EJECUCIÓN: Levantamiento de procesos terminado	9-Entregables Formales	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.51

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	EJECUCIÓN: Computadores adquiridas	9-Entregables Formales	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.51
5	EJECUCIÓN: Productos o servicios claves en los que se requiera organismos de evaluación de la conformidad definidos	9-Entregables Formales	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.51
6	EJECUCIÓN: Infraestructura tecnológica de respaldo adquirida	9-Entregables Formales	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.51
7	EJECUCIÓN: Sistema de alerta implementado	9-Entregables Formales	31/10/2014		31/10/2014		Sí	1.51
8	EJECUCIÓN: Propuestas de actividades de vigilancia del mercado con entidades acreditadas presentadas (20)	9-Entregables Formales	28/11/2014		28/11/2014		Sí	1.51
9	EJECUCIÓN: I Fase - OEC acreditados y reconocidos (34)	9-Entregables Formales	30/12/2014		23/12/2014		Sí	2.51
10	EJECUCIÓN: I Campaña Difusión y promoción realizada	9-Entregables Formales	30/12/2014		30/12/2014		Sí	0.51
11	EJECUCIÓN: I Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados	5-Entregables Intermedios	30/12/2014		23/12/2014		Sí	0.51
12	EJECUCIÓN: I Fase - Acreditaciones y reconocimientos por campo realizados (37)	9-Entregables Formales	30/12/2014		23/12/2014		Sí	2.51
13	EJECUCIÓN: I Fase - Autoridades reguladoras aplicando esquemas de inspección para vigilancia de mercados (2)	V - Verificación ejecutiva	30/12/2014		23/12/2014		Sí	1.51
14	EJECUCIÓN: I Fase - Capacitación en nuevos esquemas de acreditación ejecutada	9-Entregables Formales	30/12/2014		23/12/2014		Sí	1.51
15	EJECUCIÓN: I Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada	9-Entregables Formales	30/12/2014		30/12/2014		Sí	0.51
16	EJECUCIÓN: I Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas	9-Entregables Formales	30/12/2014		23/12/2014		Sí	1.51
17	EJECUCIÓN (Seguimiento): Reporte de informes de acciones correctivas tomadas por las autoridades reguladoras generado (1 reporte)	9-Entregables Formales	31/12/2014		23/12/2014		Sí	0.51
18	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.51
19	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.51
20	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.51

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
21	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.51
22	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.51
23	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.51
24	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada(acreditados y reconocidos)	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.51
25	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.51
26	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.51
27	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.51
28	EJECUCIÓN : Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos ejecutada	9-Entregables Formales	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.51
29	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.51
30	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.51
31	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.51
32	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.51
33	EJECUCIÓN (Seguimiento): Reporte de informes de acciones correctivas tomadas por las autoridades reguladoras ejecutado (1 reporte)	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.51
34	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos)	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.51
35	EJECUCIÓN: II Fase - OEC acreditados y reconocidos (18)	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	2.51
36	EJECUCIÓN: II Fase - Acreditaciones y reconocimientos por campo realizados (20)	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	2.51
37	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.51
38	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.51

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.51
40	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.51
41	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.51
42	EJECUCIÓN : Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos ejecutada	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.51
43	EJECUCIÓN: II Campaña Difusión y promoción realizada	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.51
44	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.51
45	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.51
46	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.51
47	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.51
48	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.51
49	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.51
50	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.51
51	EJECUCIÓN: II Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados	9-Entregables Formales	30/12/2015		30/12/2015		Sí	0.51
52	EJECUCIÓN: II Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas	9-Entregables Formales	30/12/2015		30/12/2015		Sí	0.51
53	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.51
54	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.51
55	EJECUCIÓN (Seguimiento): Reporte de informes de acciones correctivas tomadas por las autoridades reguladoras ejecutado (1 reporte)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.51
56	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.51

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
57	EJECUCIÓN : Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos ejecutada	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.51
58	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.51
59	EJECUCIÓN: II Fase - OEC acreditados y reconocidos (18)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.76
60	EJECUCIÓN: II Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.51
61	EJECUCIÓN: II Fase - Acreditaciones y reconocimientos por campo realizados (22)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.77
62	EJECUCIÓN: II Fase - Autoridades reguladoras aplicando esquemas de inspección para vigilancia de mercados (4 acumulado)	V - Verificación ejecutiva	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.51
63	EJECUCIÓN: II Fase - Capacitación en nuevos esquemas de acreditación ejecutada	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.51
64	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.51
65	EJECUCIÓN (Seguimiento):Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/01/2016		31/01/2016		Sí	0.51
66	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.51
67	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.51
68	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.51
69	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.51
70	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos)	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.51
71	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.51
72	EJECUCIÓN (Seguimiento):Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.51
73	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.51
74	EJECUCIÓN : Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos ejecutada	9-Entregables Formales	30/04/2016		30/04/2016		Sí	0.51

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
75	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.51
76	EJECUCIÓN (Seguimiento):Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/05/2016		31/05/2016		Sí	0.51
77	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.51
78	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.51
79	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	30/06/2016		30/06/2016		Sí	0.51
80	EJECUCIÓN: III Fase - OEC acreditados y reconocidos (22)	9-Entregables Formales	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.51
81	EJECUCIÓN: III Fase - Acreditaciones y reconocimientos por campo realizados (39)	9-Entregables Formales	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.51
82	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.51
83	EJECUCIÓN (Seguimiento):Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/07/2016		31/07/2016		Sí	0.51
84	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.51
85	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.51
86	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.51
87	EJECUCIÓN : Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos ejecutada	9-Entregables Formales	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.51
88	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.51
89	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.51
90	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	30/09/2016		30/09/2016		Sí	0.51
91	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/10/2016	31/10/2016			No	0.51
92	EJECUCIÓN (Seguimiento):Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/10/2016	31/10/2016			No	0.51
93	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	30/11/2016	30/11/2016			No	0.51

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
94	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	30/11/2016	30/11/2016			No	0.51
95	EJECUCIÓN: III Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados	9-Entregables Formales	30/12/2016	30/12/2016			No	0.51
96	EJECUCIÓN: III Fase - OEC acreditados y reconocidos (23)	9-Entregables Formales	30/12/2016	30/12/2016			No	0.51
97	EJECUCIÓN: III Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada	9-Entregables Formales	30/12/2016	30/12/2016			No	0.51
98	EJECUCIÓN: III Campaña Difusión y promoción realizada	9-Entregables Formales	30/12/2016	30/12/2016			No	0.51
99	EJECUCIÓN: III Fase - Acreditaciones y reconocimientos por campo realizados (39)	9-Entregables Formales	30/12/2016	30/12/2016			No	0.51
100	EJECUCIÓN: III Fase - Autoridades reguladoras aplicando esquemas de inspección para vigilancia de mercados (7 acumulado)	V - Verificación ejecutiva	30/12/2016	30/12/2016			No	0.51
101	EJECUCIÓN: III Fase - Capacitación en nuevos esquemas de acreditación ejecutada	9-Entregables Formales	30/12/2016	30/12/2016			No	0.51
102	EJECUCIÓN: III Fase- Actividades encaminadas a promover el interés de los OEC realizadas	9-Entregables Formales	30/12/2016	30/12/2016			No	0.51
103	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/12/2016	31/12/2016			No	0.51
104	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/12/2016	31/12/2016			No	0.51
105	EJECUCIÓN (Seguimiento): Reporte de informes de acciones correctivas tomadas por las autoridades reguladoras ejecutado(2reportes)	9-Entregables Formales	31/12/2016	31/12/2016			No	0.51
106	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	31/12/2016	31/12/2016			No	0.51
107	EJECUCIÓN : Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos ejecutada	9-Entregables Formales	31/12/2016	31/12/2016			No	0.51
108	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	31/12/2016	31/12/2016			No	0.51
109	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/01/2017	31/01/2017			No	0.51
110	EJECUCIÓN (Seguimiento):Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/01/2017	31/01/2017			No	0.51

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
111	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	28/02/2017	28/02/2017			No	0.51
112	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	28/02/2017	28/02/2017			No	0.51
113	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/03/2017	31/03/2017			No	0.51
114	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/03/2017	31/03/2017			No	0.51
115	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	31/03/2017	31/03/2017			No	0.51
116	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	30/04/2017	30/04/2017			No	0.51
117	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	30/04/2017	30/04/2017			No	0.51
118	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	30/04/2017	30/04/2017			No	0.51
119	EJECUCIÓN : Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos ejecutada	9-Entregables Formales	30/04/2017	30/04/2017			No	0.51
120	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/05/2017	31/05/2017			No	0.51
121	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/05/2017	31/05/2017			No	0.51
122	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	30/06/2017	30/06/2017			No	0.51
123	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	30/06/2017	30/06/2017			No	0.51
124	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	30/06/2017	30/06/2017			No	0.51
125	EJECUCIÓN: IV Fase - OEC acreditados y reconocidos (28)	9-Entregables Formales	30/06/2017	30/06/2017			No	0.51
126	EJECUCIÓN: IV Fase - Acreditaciones y reconocimientos por campo realizados (40)	9-Entregables Formales	30/06/2017	30/06/2017			No	0.51
127	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/07/2017	31/07/2017			No	0.51
128	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/07/2017	31/07/2017			No	0.51
129	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/08/2017	31/08/2017			No	0.51

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
130	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/08/2017	31/08/2017			No	0.51
131	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	31/08/2017	31/08/2017			No	0.51
132	EJECUCIÓN : Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos ejecutada	9-Entregables Formales	31/08/2017	31/08/2017			No	0.51
133	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	30/09/2017	30/09/2017			No	0.51
134	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	30/09/2017	30/09/2017			No	0.51
135	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	30/09/2017	30/09/2017			No	0.51
136	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/10/2017	31/10/2017			No	0.51
137	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/10/2017	31/10/2017			No	0.51
138	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	30/11/2017	30/11/2017			No	0.51
139	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	30/11/2017	30/11/2017			No	0.51
140	EJECUCIÓN: IV Fase - 25% de Certificados de productos sujetos a control para importación verificados	9-Entregables Formales	29/12/2017	29/12/2017			No	0.51
141	EJECUCIÓN: IV Fase - OEC acreditados y reconocidos (29)	9-Entregables Formales	29/12/2017	29/12/2017			No	0.77
142	EJECUCIÓN: Adquisición y mantenimiento de licenciamiento de software de escritorio ejecutado	9-Entregables Formales	29/12/2017	29/12/2017			No	0.51
143	EJECUCIÓN: IV Campaña Difusión y promoción realizada	9-Entregables Formales	29/12/2017	29/12/2017			No	0.51
144	EJECUCIÓN: IV Fase - Acreditaciones y reconocimientos por campo realizados (41)	9-Entregables Formales	29/12/2017	29/12/2017			No	0.76
145	EJECUCIÓN: IV Fase - Autoridades reguladoras aplicando esquemas de inspección para vigilancia de mercados (10 acumulado)	V - Verificación ejecutiva	29/12/2017	29/12/2017			No	0.51
146	EJECUCIÓN: IV Fase de mantenimiento de equipo tecnológico ejecutada	9-Entregables Formales	29/12/2017	29/12/2017			No	0.51
147	EJECUCIÓN: Reportes de informes de acciones correctivas tomadas por las autoridades reguladoras ejecutado	V - Verificación ejecutiva	29/12/2017	29/12/2017			No	0.51

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
148	CIERRE: Informe consolidado de ejecución de proyecto elaborado	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.49
149	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas de productos peligrosos identificadas y comunicadas	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.52
150	EJECUCIÓN (Seguimiento): Alertas para análisis identificadas	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.43
151	EJECUCIÓN (Seguimiento): Reporte de informes de acciones correctivas tomadas por las autoridades reguladoras ejecutado (2reportes)	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.52
152	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.35
153	EJECUCIÓN : Evaluación in situ para acreditaciones y reconocimientos ejecutada	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.35
154	EJECUCIÓN : Revisión de solicitudes iniciales y de ampliación ejecutada (acreditados y reconocidos)	9-Entregables Formales	31/12/2017	31/12/2017			No	0.35

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Certificados verificados		100.00 %	0.1873	0.1873	01/01/2014	Septiembre
2	Número de OEC acreditados y reconocidos		101.74 %	230	234	01/01/2014	Ene-Jun
3	Número OEC acreditados y reconocidos de laboratorios de ensayo, calibración y clínicos		92.86 %	14	13	01/01/2014	Ene-Jun
4	Número de OEC acreditados y reconocidos de Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión, Productos y Personas		100.00 %	1	1	01/01/2014	Ene-Jun
5	Número de OEC Acreditados y reconocidos de Organismos de inspección, (Agroalimentario, Industrial y Ambiental)		225.00 %	4	9	01/01/2014	Ene-Jun
6	Número de acreditaciones y reconocimientos por campo		114.58 %	583	668	01/01/2014	Ene-Jun
7	Número acreditaciones y reconocimientos por campo de laboratorios de ensayo, calibración y clínicos		144.00 %	25	36	01/01/2014	Ene-Jun
8	Número de acreditaciones y reconocimientos por campo de organismos de certificación de Sistemas de gestión, productos y personas		3,000.00 %	1	30	01/01/2014	Ene-Jun
9	Número de acreditaciones y reconocimientos por campo de Organismos de inspección,		850.00 %	6	51	01/01/2014	Ene-Jun

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
	(Agroalimentario, Industrial y Ambiental)						
10	% de Reguladores en el Sistema de Inspección		-	-	-	01/01/2014	-
11	Número de mantenimientos de equipo tecnológico		66.67 %	3	2	01/01/2015	Ene-Jun
12	Porcentaje de administración, coordinación y seguimiento del sistema de alertas		100.00 %	0.125	0.125	01/01/2015	Ene-Jun
13	Número de campañas realizadas		-	-	-	01/01/2015	-
14	Porcentaje de actividades encaminadas a promover el interés de los OEC		100.00 %	0.1666	0.1666	01/01/2015	Ene-Jun
15	Porcentaje de actividades de capacitación en nuevos esquemas de acreditación		100.00 %	0.1667	0.1667	01/01/2015	Ene-Jun
16	Número de reportes de informes de acciones correctivas		100.00 %	0	0	01/01/2015	Ene-Jun
17	Porcentaje de actividades de monitoreo		100.00 %	0.125	0.125	01/01/2015	Ene-Jun
18	Porcentaje de Licenciamiento de software de escritorio		-	-	-	01/07/2016	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,099,056.36 **
Costo Total:	4,536,546.58
Total Devengado:	1,835,685.30
% Costo Total Devengado:	40.46 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 40.46 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,412,394.33	725,926.93	1,037,326.12	4,175,647.38
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,412,394.33	725,926.93	0.00	3,138,321.26
Ppto. Codificado	1,501,357.61	643,721.33	0.00	2,145,078.94
Ppto. Comprometido	1,418,420.24	432,341.66	0.00	1,850,761.90
Planeado - Codificado (2016)		82,205.60		
Programado a Devengar	1,501,357.61	648,915.54	1,037,326.12	3,187,599.27
Ppto. Devengado	1,412,814.70	422,870.60	0.00	1,835,685.30
Estimado a fin de año	* 1,412,814.70	0.00	0.00	1,412,814.70
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	88,542.91	648,915.54	1,037,326.12	1,774,784.57
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 94.10 %	65.17 %	0.00 %	57.59 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

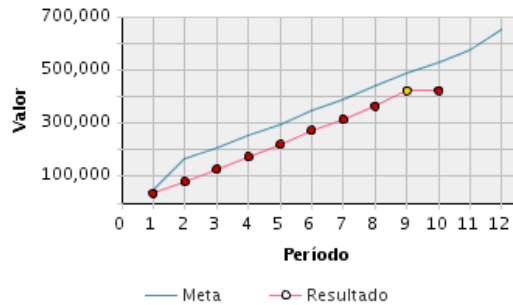

Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	49,066.65	36,073.02	49,066.65	36,073.02	73.52 %		5.56 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	117,547.53	43,988.18	166,614.18	80,061.20	48.05 %		12.34 %
Mar	42,065.73	47,144.38	208,679.91	127,205.58	60.96 %		19.60 %
Abr	44,427.50	45,672.01	253,107.41	172,877.59	68.30 %		26.64 %
May	43,809.62	46,033.31	296,917.03	218,910.90	73.73 %		33.73 %
Jun	49,173.73	52,603.72	346,090.76	271,514.62	78.45 %		41.84 %
Jul	44,093.58	43,147.94	390,184.34	314,662.56	80.64 %		48.49 %
Ago	50,041.39	49,647.90	440,225.73	364,310.46	82.76 %		56.14 %
Sep	44,350.82	58,560.14	484,576.55	422,870.60	87.27 %		65.17 %
Oct	44,350.82	0.00	528,927.37	422,870.60	79.95 %		65.17 %
Nov	44,350.82		573,278.19				
Dic	75,637.35		648,915.54				
Total	648,915.54	422,870.60					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
9	Incrementar el número de acreditaciones, campos y acreditaciones por campo de organismos de certificación MEDIANTE la implementación de nuevos esquemas de acreditación y la promoción de la acreditación.
10	Mantener el control sobre la calidad de los productos importados MEDIANTE la verificación de la validez en el ámbito de la acreditación de los certificados de conformidad.

Objetivos Operativos Matriciales	
SAE - Servicio de Acreditación Ecuatoriano >Coordinación General Técnica >Dirección de Inspección	
6	Incrementar el número de organismos de inspección acreditados MEDIANTE el desarrollo de nuevos campos de acreditación.
SAE - Servicio de Acreditación Ecuatoriano >Coordinación General Técnica >Dirección de Laboratorios	
12	Incrementar el número de acreditaciones, campos y acreditaciones por campo de laboratorios y proveedores de ensayos de aptitud MEDIANTE la implementación de nuevos esquemas de acreditación y la promoción de la acreditación

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
SAE-001	Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad
SAE-006	Servicio de Alertas de Productos
SAE-007	Formación de Evaluadores

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.0.pdf	Acta_de_Constitución_Inversión.pdf	27/10/2015
2	A.1.pdf	PROYECTO_INVERSION_OAE_2014-2017__REPROGRAMACIONAL.pdf	28/10/2014
3	A.2. pdf	dictámen_de_prioridad.pdf	28/10/2014
4	A.2.1.pdf	SAE-Dictamen_Prioridad_2014-2017.pdf	19/06/2015
5	A.3.pdf	Oficio_validación_de_proyecto_por_MCPEC_28_mar_2014.pdf	28/10/2014
6	A.4. pdf	OAE-Declaración_proyecto_emblemá_DE.pdf	28/10/2014
7	A.5.pdf	Ficha_Proyecto_postulado_2015.pdf	28/10/2014
8	A.6.pdf	Ley_Sistema_Ecuatoriano_de_la_Calidad.pdf	28/10/2014
9	A.7.pdf	Documentos_Aprobaciones_Proyecto.rar	03/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
10	A.8.pdf	PROCESOS_COMPRAS_PUBLICAS-PROYECTOS_DE_INVERSIÓN.rar	27/10/2015
11	A.9.pdf	Cédula_presupuestaria_Dic_a_Dic_2015.pdf	01/03/2016
12	A.9.pdf	Cédula_presupuestaria_ene_a_dic_2015.pdf	01/03/2016
13	A.9.pdf	Cédula_presupuestaria_Enero_2016.pdf	01/03/2016
14	A.9.pdf	Cédula_presupuestaria_Febrero_2016.pdf	01/03/2016
15	A.9.pdf	Cédula_presupuestaria_Ene_feb_2016.pdf	01/03/2016
16	A.9.pdf	Cédula_presupuestaria_Marzo_2016.pdf	07/04/2016
17	A.9.pdf	Cédula_presupuestaria_Abril_2016.pdf	09/05/2016
18	A.9.pdf	Cédula_presupuestaria_Mayo_2016.pdf	02/06/2016
19	A.9.pdf	Cédula_presupuestaria_Junio_2016.pdf	05/07/2016
20	A.9.pdf	Cédula_presupuestaria_Julio_2016.pdf	03/08/2016
21	A.9.pdf	Cédula_presupuestaria_Agosto_2016.pdf	05/09/2016
22	A.9.pdf	Cédula_presupuestaria_Septiembre_2016.pdf	03/10/2016
23	A.9.pdf	Seguimiento_partida_730601_Consultoría_Asesoría_e_Inves	08/12/2015
24	A.9.pdf	Seguimiento_partida_730601_Consultoría_Asesoría_e_Inves	08/12/2015
25	A.9.rar	Cédulas_presupuestarias_enero_noviembre_2015.rar	08/12/2015
26	B.1.pdf	Seguimiento_Diciembre_2015.pdf	01/03/2016
27	B.1.pdf	Informe_Enero_2016.pdf	17/03/2016
28	B.1.pdf	Informe_Febrero_2016.pdf	17/03/2016
29	B.1.pdf	Informe_Marzo_2016.pdf	06/04/2016
30	B.1.pdf	Informe_Abril_2016.pdf	05/05/2016
31	B.1.pdf	Informe_Julio_2016.doc.pdf	03/08/2016
32	B.1.pdf	Informe_Mayo_2016_2_Cor.pdf	08/08/2016
33	B.1.pdf	Informe_Junio_2016.doc_Cor.pdf	08/08/2016
34	B.1.pdf	Informe_Agosto_2016.pdf	05/09/2016
35	B.1.pdf	Informe_Septiembre_2016.pdf	04/10/2016
36	B.1.pdf	Seguimiento_junio_noviembre_2015.pdf	08/12/2015
37	B.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_1.- _PROYECTO_DISEÑO_DE_METODOLOGÍA_Y_PROCESOS_DEL_SISTEMA_DE_ALERTA	06/11/2014
38	B.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_2.- _ACTAS_INFORMES__FORMULARIOS_TDR_APROBACIONES_PRODUCTOS_CO	04/11/2014
39	B.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_3.- _ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCIÓN_PRODUCTO_1_(Levan_proce_term).pdf	06/11/2014
40	B.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_3.- _ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCIÓN_PRODUCTO_2_(Levan_proce_term).pdf	06/11/2014
41	B.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_3.- _ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCIÓN_PRODUCTO_3_(Levan_proce_term).pdf	06/11/2014
42	B.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_3.- _TDR_SISTEMA_DE_ALERTAS_(Levan_proce_term).pdf	06/11/2014
43	B.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_4.- _ORDEN_DE_COMPRA_CYBERBOX_(Compra_computadores).pdf	23/12/2014
44	B.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_4.- _ORDEN_DE_COMPRA_GRUPO_INFORMÁTICO_(Compra_computadores).pdf	23/12/2014
45	B.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_4.- _ORDEN_DE_COMPRA_VAGADAMIA(Compra_computadores).pdf	23/12/2014
46	B.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_4.- _FACTURA_GRUPO_INFORMÁTICO_(Compra_computadores).pdf	23/12/2014
47	B.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_4.- _ACTA_ENTREGA_CYBERBOX_(Compra_computadores).pdf	23/12/2014
48	B.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_4.- _ACTA_ENTREGA_GRUPO_INFORMÁTICO_(Compra_computadores).pdf	23/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
49	B.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_4.- _FACTURAS_CYBERBOX_(Compra_computadores).pdf	23/12/2014
50	B.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_5_- _PRODUCTOS_O_SERVICIOS_CLAVES_IDENTIFICADOS.pdf	23/12/2014
51	B.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_5_- _PRODUCTOS_O_SERVICIOS_CLAVES_IDENTIFICADOS_(Acta_entrega_recepcion_P1).pdf	23/12/2014
52	B.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_5_- _PRODUCTOS_O_SERVICIOS_CLAVES_IDENTIFICADOS_(Acta_de_entrega_recepcion_P	23/12/2014
53	B.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_5_- _PRODUCTOS_O_SERVICIOS_CLAVES_IDENTIFICADOS_(Constancia_de_recepcion_pro	23/12/2014
54	B.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_5_- _PRODUCTOS_O_SERVICIOS_CLAVES_IDENTIFICADOS_(Contrato_sankesam_s.a._p1).pdf	23/12/2014
55	B.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_5_- _PRODUCTOS_O_SERVICIOS_CLAVES_IDENTIFICADOS_(Factura_consultoría_P2).pdf	23/12/2014
56	B.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_5_- _PRODUCTOS_O_SERVICIOS_CLAVES_IDENTIFICADOS_(Factura_P1).pdf	23/12/2014
57	B.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_5_- _PRODUCTOS_O_SERVICIOS_CLAVES_IDENTIFICADOS_(Informe_administrador_del_co	23/12/2014
58	B.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_5_- _PRODUCTOS_O_SERVICIOS_CLAVES_IDENTIFICADOS_(Informe_de_conformidad_adm	23/12/2014
59	B.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_5_- _PRODUCTOS_O_SERVICIOS_CLAVES_IDENTIFICADOS_(Informe_de_seguimiento_de_c	23/12/2014
60	B.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_5_- _PRODUCTOS_O_SERVICIOS_CLAVES_IDENTIFICADOS_PRODUCTO_UNO_- _PROCESO_CDC-SAE-026-2014.pdf	23/12/2014
61	B.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_5_- _PRODUCTOS_O_SERVICIOS_CLAVES_IDENTIFICADOS_(informe_de_seguimiento_pro	23/12/2014
62	B.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_6_- _INFORME_TÉCNICO_NETWORKING_Y_TDR_(Infraestructura_tecnológica_procesos_fall	14/10/2015
63	B.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_6_- _INFORME_PROVEEDOR_ESPECIFIC_TÉCNICAS_INFORME_TÉCNICO_ACTA_ENTR	14/10/2015
64	B.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_7_- _ACTA_ENTREGA_RECEPCIÓN_(Sistema_de_alertas).pdf	23/12/2014
65	B.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_7_- _CONTRATO_(sistema_de_alertas).pdf	23/12/2014
66	B.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_7_- _FACTURA_(sistema_de_alertas).pdf	23/12/2014
67	B.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_7_- _PRODUCTO_1_DOCUMENTO_VISIONAMIENTO_SIAP_V3_(Sistema_de_alertas).pdf	23/12/2014
68	B.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_7_- _RESOLUCIÓN_NUEVO_ADMINISTRADOR_(Sistema_de_alertas).pdf	23/12/2014
69	B.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_7_- INFORME_VISIONAMIENTO_DEL_PRODUCTO_SIAP_versión_3.0_(Sistema_de_alertas).pdf	23/12/2014
70	B.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_7_- INFORME_ADMINISTRADOR_DEL_CONTRATO_(sistema_de_alertas).pdf	23/12/2014
71	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8_- _ACTA_DE_REUNIÓN_TURISMO_DE_AVENTURA_(Propu_de_act_de_vigilancia).pdf	23/12/2014
72	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8_- _CRITERIOS_ESPECÍFICOS_SERVICIOS_SOCIALES_(Propu_de_act_de_vigilancia).pdf	23/12/2014
73	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8_- _ESQUEMA_DE_EVALUACIÓN_SERVICIOS_SOCIALES_(Propu_de_act_de_vigilancia).pdf	23/12/2014
74	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8_- _CONVOCATORIA_SERVICIOS_PÚBLICOS_(Propu_de_act_de_vigilancia).pdf	23/12/2014
75	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8_- _CRONOGRAMA_LICENCIAMIENTO_DIALISIS_(Propu_de_act_de_vigilancia).pdf	23/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
76	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8.- _CUMPLIMIENTO_ESTABLECIMIENTOS_DE_SALUD_(Propu_de_act_de_vigilancia).pdf	23/12/2014
77	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8.- _INSTRUCTIVO_CIBV_(Propu_de_act_de_vigilancia).pdf	23/12/2014
78	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8.- _LISTA_DE_REUNIÓN_10_SEPT_2014_(Propu_de_act_de_vigilancia).pdf	23/12/2014
79	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8.- _OFICIO_ACREDITACIÓN_DE_LA_CONFORMIDAD_EN_TURISMO_(Propu_de_act_de_vigilancia).pdf	23/12/2014
80	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8.- _OFICIO_EMPRESAS_CERTIFICADAS_PARA_VERIFICAR_E_INSPECCIONAR_TELEFÓNICAMENTE	23/12/2014
81	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8.- _OFICIO_QUITO_TURISMO_(Propu_de_act_de_vigilancia).pdf	23/12/2014
82	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8.- _ACTA_REUNIÓN_CALIDAD_DE_SERVICIOS_DIGNOS_SOCIALES_(Propu_de_act_de_vigilancia).pdf	07/01/2015
83	B.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_8.- _REGISTRO_DE_ASISTENCIA_DE_SERVICIOS_DIGNOS_SOCIALES_CIBV_DISCAPACITADOS	07/01/2015
84	C.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_9.- _N_de_laboratorios_acreditados_y_reconocidos_julio_diciembre_2014.pdf	10/01/2015
85	C.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_9.- _N_de_Laboratorios_acreditados_y_reconocidos_ene_jun_2014.pdf	10/01/2015
86	C.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_9.- _N_de_Organismos_de_Certificación_acreditados_y_reconocidos_ene_diciembre_2014.pdf	10/01/2015
87	C.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_9.- _N_de_Organismos_de_Inspección_acreditados_y_reconocidos_ene_dic_2014_(2).pdf	10/01/2015
88	C.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_9.- _N_de_Organismos_de_Inspección_acreditados_y_reconocidos_ene_dic_2014.pdf	10/01/2015
89	C.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_10_y_43.- _INFORME_CAMPAÑAS_Y_FOTOGRAFÍAS_REALIZADAS_(Campaña_Difusión_y_promoción)	06/10/2015
90	C.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_11.- _REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS.pdf	23/12/2014
91	C.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_12.- _Certificado_N_de_acreditaciones_y_reconocimientos_de_campo_Organismos_de_Inspección	10/01/2015
92	C.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_12.- _Medios_de_verificación_N_de_acreditaciones_y_reconocimientos_de_campo_Organismos	10/01/2015
93	C.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_12.- _N_de_acreditaciones_y_reconocimientos_de_campo_de_laboratorios_ene_jun_2014.pdf	10/01/2015
94	C.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_12.- _N_de_acreditaciones_y_reconocimientos_de_campo_de_laboratorios_jul_dic_2014.pdf	10/01/2015
95	C.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_12.- _N_de_acreditaciones_y_reconocimientos_de_campo_Organismos_de_Certificación_ene_jun_2014.pdf	10/01/2015
96	C.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_12.- _N_de_acreditaciones_y_reconocimientos_de_campo_Organismos_de_Certificación_jul_ene_2014.pdf	10/01/2015
97	C.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_13.- _AUTORIDADES_REGULADORAS_APLICANDO_ESQUEMAS_DE_INSPECCIÓN.pdf	07/01/2015
98	C.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_14.- _CURSO_MIES_DISCAPACIDADES_Y_CIBV_(capac_nuevos_esquemas).pdf	23/12/2014
99	C.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_14.- _CURSO_NORMA_INEN_ISO_IEE_17020_2013_(capac_nuevos_esquemas).pdf	23/12/2014
100	C.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_14.- _CURSO_EN_ESQUEMAS_DE_ACREDITACIÓN_PARA_SERVICIOS_SOCIALES_EN_EL_CIBV	07/01/2015
101	C.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_14.- _CURSO_OTORGADO_CON_MIES SOBRE_NORMATIVA PARA_PERSONAS_CON_DISCAPACIDAD	07/01/2015
102	C.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_14.- _CURSO_PRÁCTICO_CON_EL_MSP_PARA_INSPECCIÓN_DE_CENTROS_DE_SALUD_(CIBV)	07/01/2015
103	C.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_14.- _PARTICIPACIÓN_EN_PLAN_PILOTO_PARA_LAS_MATRICES_DE_LICENCIAMIENTO_EN_EL_CIBV	07/01/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
104	C.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_16.- _AGENDA_FORO_RIESGOS_SANITARIOS_FÁRMACOS_	23/12/2014
105	C.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_16.- _INFORME_DE_ACTIVIDADES_(Promover_interés_OEC).pdf	23/12/2014
106	C.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_16.- _INVITACIÓN_A_ACTO_INAUGURAL_DE_EXPO_- _CALIDAD_2014_(Promover_interés_OEC).pdf	23/12/2014
107	C.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_16.- _REGISTRO_FIRMAS_CURSO_NORMAS_APLICABLES_	23/12/2014
108	C.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_16.- _REGISTRO_FIRMAS_CURSO_NORMAS_PARA_ACREDITACIÓN_Y_ACTIVIDADES_SAE	23/12/2014
109	C.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_16.- _SEMANA_DE_LA_CALIDAD_(Promover_interés_OEC).pdf	23/12/2014
110	C.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_17.- _RESOLUCIÓN_(Reporte_de_informes_de_acciones_correctivas_tomadas_por_autoridades)	08/01/2015
111	C.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_18.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_enero_2015.pdf	18/03/2015
112	D.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_19.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_(enero)	31/03/2015
113	D.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_20.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_(febre)	02/04/2015
114	D.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_21.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_febrero_2015.pdf	18/03/2015
115	D.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_22.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_(mar)	12/05/2015
116	D.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_23.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_Marzo_2015.pdf	12/05/2015
117	D.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_24.- _CERTIFICACIÓN_(Revisión_de_solicitudes_iniciales_y_de_ampliación_ejecutada)_MAR_20	13/04/2015
118	D.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_24.- _INSPECCIÓN_(Revisión_de_solicitudes_iniciales_y_de_ampliación_ejecutada)_MAR_2015.	13/04/2015
119	D.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_24.- _LABORATORIOS_(Revisión_de_solicitudes_iniciales_y_de_ampliación_ejecutada)_MAR_20	13/04/2015
120	D.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_25.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_Abril	12/05/2015
121	D.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_26.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_Abril_2015.pdf	12/05/2015
122	D.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO27.- _REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_EJECUTADAS_(acreditados_y_reconocidos)_L	08/05/2015
123	D.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO27.- _REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_EJECUTADAS_(acreditados_y_reconocidos)_ir	08/05/2015
124	D.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO27.- _REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_EJECUTADAS_(acreditados_y_reconocidos)_C	11/05/2015
125	E.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO28.- _EVALUACIÓN_IN_SITU_PARA_ACREDITACIONES_Y_RECONOCIMIENTOS_EJECUTAD	08/05/2015
126	E.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO28.- _EVALUACIÓN_IN_SITU_PARA_ACREDITACIONES_Y_RECONOCIMIENTOS_EJECUTAD	08/05/2015
127	E.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO28.- _EVALUACIÓN_IN_SITU_PARA_ACREDITACIONES_Y_RECONOCIMIENTOS_EJECUTAD	11/05/2015
128	E.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_29.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_may	12/06/2015
129	E.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_30.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_Mayo_2015.pdf	12/06/2015
130	E.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_31.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_Juni	02/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
131	E.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_32.- _ALERTAS_PARA_ANALISIS_IDENTIFICADAS_Junio_2015.pdf	02/07/2015
132	E.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_33.- _RESOLUCIÓN_BUREAU_(Reporte_de_informes_de_acciones_correctivas_tomadas_por_	03/07/2015
133	E.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_34.- _CERTIFICACIÓN_(Revisión_de_solicitudes_iniciales_y_de_ampliación_ejecutada)_JUN_20	03/07/2015
134	E.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_34.- _INSPECCIÓN_(Revisión_de_solicitudes_iniciales_y_de_ampliación_de_alcance_ejecutada)	08/07/2015
135	E.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_34.- _LABORATORIOS_(Revisión_de_solicitudes_iniciales_y_de_ampliación_de_alcance_ejecuta	09/07/2015
136	E.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_35.- _OEC_ACREDITADOS_Y_RECONOCIDOS.pdf	22/09/2015
137	E.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_36.- _ACREDITACIONES_Y_RECONOCIMIENTOS_POR_CAMPO_enero_junio_2015.pdf	01/10/2015
138	F.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_37.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_Julio	06/08/2015
139	F.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_38.- _ALERTAS_PARA_ANALISIS_IDENTIFICADAS_Julio_2015.pdf	06/08/2015
140	F.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_39.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_Agost	03/09/2015
141	F.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_40.- _ALERTAS_PARA_ANALISIS_IDENTIFICADAS_Agosto_2015.pdf	03/09/2015
142	F.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_41.- _CERTIFICACIÓN_REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_EJECUTADA_(acreditados	08/09/2015
143	F.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_41.- _LABORATORIOS_REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_EJECUTADA_(acreditados	08/09/2015
144	F.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_41.- _INSPECCIÓN_REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_EJECUTADA_(acreditados_y_	22/09/2015
145	F.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_42.- _CERTIFICACIÓN_EVALUACIÓN_IN_SITU_(acreditaciones_y_reconocimientos)_agosto_	08/09/2015
146	F.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_42.- _INSPECCIÓN_EVALUACIÓN_IN_SITU_(acreditaciones_y_reconocimientos)_agosto_201	08/09/2015
147	F.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_42.- _LABORATORIOS_EVALUACIÓN_IN_SITU_(acreditaciones_y_reconocimientos)_agosto_	08/09/2015
148	F.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_44.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_Septie	05/10/2015
149	F.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_45.- _ALERTAS_PARA_ANALISIS_IDENTIFICADAS_Septiembre_2015.pdf	05/10/2015
150	G.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_46.- _REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_Y_DE_AMPLIACIÓN_EJECUTAD_A_SEPT_20	07/10/2015
151	G.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_47.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_Octub	05/11/2015
152	G.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_48.- _ALERTAS_PARA_ANALISIS_IDENTIFICADAS_Octubre_2015.pdf	05/11/2015
153	G.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_49.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_Novie	03/12/2015
154	G.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_50.- _ALERTAS_PARA_ANALISIS_IDENTIFICADAS_Noviembre_2015.pdf	03/12/2015
155	G.6. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_51.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS.pdf	19/02/2015
156	G.6. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_51.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_(FEB).pdf	04/03/2015
157	G.6. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_51.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Diciembre	29/12/2015
158	G.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_51.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_abril.pdf	08/05/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
159	G.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_51.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_mayo2015	12/06/2015
160	G.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_51.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_junio_2015	03/07/2015
161	G.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_51.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Julio2015.	06/08/2015
162	G.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_51.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Agosto_20	07/09/2015
163	G.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_51.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Septiembre	08/10/2015
164	G.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_51.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Octubre_2	05/11/2015
165	G.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_51.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Noviembre	29/12/2015
166	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _LISTA_DE_ASISTENTES_TALLER_SIAP_(Promover_interés_OEC).pdf	19/02/2015
167	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _OFICIO_UNIVERSIDAD_DE_SANTA_ELENA_(Promover_interés_OEC).pdf	19/02/2015
168	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _LISTA_DE_INVITADOS_RENDICIÓN_DE_CUENTAS_GUAYAQUIL_(Promover_interés_OE	06/03/2015
169	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REUNIÓN_DE_LEVANTAMIENTO_DE_INFORMACIÓN_PROCESOS_CON_SENAE_(Promo	06/03/2015
170	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REUNIÓN_SOBRE_REGLAMENTOS_TÉCNICOS_ECUATORIANOS_CON_INEN_(Promo	06/03/2015
171	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REGISTRO_DE_ASISTENCIA_ISO_IEC_1720_(Promover_interés_OEC)_mar_2015.pdf	31/03/2015
172	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REGISTRO_DE_ASISTENCIA_RENDICIÓN_DE_CUENTAS_(Promover_interés_OEC)_mar	31/03/2015
173	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REGISTRO_DE_ASISTENCIA_TALLER_NORMA_NTE_INEN_ISO_IEC_17025_2006_(Promo	31/03/2015
174	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _FOTOGRAFÍAS_EVENTOS_(Promover_interés_OEC)_mar_2015.pdf	31/03/2015
175	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REGISTRO_DE_ASISTENCIA_ISO_IEC_1720_(Promover_interés_OEC)_abril_2015.pdf	08/05/2015
176	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _NORMAS_CRITERIOS_ACTAS_DE_REUNIONES_(Promover_interés_OEC)_mayo_2015.p	19/06/2015
177	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _INFORME_DE_ACTIVIDADES_(Promover_el_Interés_OECs)_junio_2015.pdf	02/07/2015
178	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _LISTA_ASISTENTES_REUNIÓN_CALTU_(Promover_el_Interés_OECs)_junio_2015.pdf	02/07/2015
179	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _INFORME_DE_ACTIVIDADES_FERIA_CIUDADANA_(Promover_el_Interés_OECs)_julio_2	06/08/2015
180	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _ACTAS_DE_REUNIONES_(Promover_interés_OEC)_julio_2015.pdf	06/08/2015
181	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REGISTRO_DE_ASISTENCIA_(Promover_interés_OEC)_agosto_2015.pdf	03/09/2015
182	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REGISTRO_DE_ASISTENCIA_Y_CERTIFICADO_(Promover_interés_OEC)_septiembre_20	14/10/2015
183	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REGISTRO_DE_ASISTENCIA_AUDITORÍAS_19011_Y_15189_(Promover_interés_OEC)_C	11/11/2015
184	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REGISTRO_DE_ASISTENCIA_AUDITORÍAS_19011_Y_15189_(Promover_interés_OEC)_C	11/11/2015
185	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REGISTRO_DE_ASISTENCIA_AUDITORÍAS_19011_Y_15189_(Promover_interés_OEC)_C	11/11/2015
186	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REGISTRO_ASISTENCIA_(Promover_interés_OEC)_dic_2015.pdf_(2).pdf	29/12/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
187	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- _REGISTRO_ASISTENCIA_(Promover_interés_OEC)_noviembre_2015.pdf.pdf	29/12/2015
188	G.7. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_52.- CONTROL_ENTREGA_DE_CERTIFICADOS_(Promover_interés_OEC)_dic_2015.pdf.pdf	29/12/2015
189	G.8. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_53.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_Diciembre	29/12/2015
190	G.9. pdf	ASOCIACIÓN_HITO_54.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_Diciembre_2015.pdf	29/12/2015
191	H.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_55.- _RESOLUCIÓN_BUREAU_(Reporte_de_informes_acciones_correctivas_tomadas_por_au	30/12/2015
192	H.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_56.- _CERTIFICACIÓN_REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_EJECUTADA_(acreditados	29/12/2015
193	H.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_56.- _INSPECCIÓN_REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_EJECUTADA_(acreditados_y_	30/12/2015
194	H.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_57.- _LABORATORIOS_EVALUACIÓN_IN_SITU_(acreditaciones_y_reconocimientos)_diciemb	29/12/2015
195	H.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_57.- _CERTIFICACIÓN_EVALUACIÓN_IN_SITU_(acreditaciones_y_reconocimientos)_diciembr	29/12/2015
196	H.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_57.- _INSPECCIÓN_EVALUACIÓN_IN_SITU_(acreditaciones_y_reconocimientos)_diciembre_2	30/12/2015
197	H.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_58.- _REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_Y_DE_AMPLIACIÓN_EJECUTAD_A_Diciembre	29/12/2015
198	H.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_58.- _REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_Y_DE_AMPLIACIÓN_EJECUTADA_Inspección	30/12/2015
199	H.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_59.- _INSPECCIÓN_OEC_ACREDITADOS_Y_RECONOCIDOS_Julio_diciembre_2015.pdf	27/04/2016
200	H.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_59.- _LABORATORIOS_OEC_ACREDITADOS_Y_RECONOCIDOS_Julio_diciembre_2015.pdf	09/05/2016
201	H.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_59.- _CERTIFICACIÓN_OEC_ACREDITADOS_Y_RECONOCIDOS_Julio_diciembre_2015.pdf	29/12/2015
202	H.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_60.- _MEMORANDO_307_SOLICITUD_DE_PAGO_MANTENIMIENTO_(Mantenimiento_de_equ	31/03/2015
203	H.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_60.- _MEMORANDO_308_SOLICITUD_DE_PAGO_MANTENIMIENTO_(Mantenimiento_de_equ	31/03/2015
204	H.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_60.- _INFORME_TÉCNICO_MANTENIMIENTO_DEL_ASEGURAMIENTO_DE_LA_INF_TECNOL	08/05/2015
205	H.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_60.- _ACTA_ENTREGA_RECEPCIÓN_(Mantenimiento_de_equipo_tecnológico_ejecutada)_may	19/06/2015
206	H.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_60.- _CERTIFICADO_INFORME_DE_CONFORMIDAD_MANTENIMIENTO_(Mantenimiento_equ	29/12/2015
207	H.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_61.- _INSPECCIÓN_ACREDITACIONES_Y_RECONOCIMIENTO_POR_CAMPO_JUL_DIC_2015	27/04/2016
208	H.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_61.- LABORATORIOS_ACREDITACIONES_Y_RECONOCIMIENTO_POR_CAMPO_JUL_DIC_20	09/05/2016
209	H.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_61.- _CERTIFICACIÓN_ACREDITACIONES_Y_RECONOCIMIENTO_POR_CAMPO_JUL_DIC_	30/12/2015
210	H.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_62.- _AUTORIDADES_REGULADORAS_APLICANDO_ESQUEMAS_DE_INSPECCIÓN_a_diciem	30/12/2015
211	H.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_63.- _LISTAS_DE_CAPACITACIONES_Y_DE_ASISTENCIAS_(II_Fase_capacitación_nuevos_er	08/07/2015
212	H.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_63.- _LISTAS_DE_CAPACITACIONES_Y_DE_ASISTENCIAS_(II_Fase_capacitación_nuevos_er	28/12/2015
213	I.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_64.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_Enero	11/02/2016
214	I.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_65.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_Enero_2016.pdf	11/02/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
215	I.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_66.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_Febrero	04/03/2016
216	I.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_67.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_Febrero_2016.pdf	04/03/2016
217	I.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_68.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_Marzo	07/04/2016
218	I.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_69.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_Marzo_2016.pdf	07/04/2016
219	I.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_70.- _REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_Y_DE_AMPLIACIÓN_EJECUTADA_Inspección	05/04/2016
220	I.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_70.- _REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_Y_DE_AMPLIACIÓN_EJECUTADA_Laboratori	05/04/2016
221	I.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_70.- _REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_Y_DE_AMPLIACIÓN_EJECUTADA_Certificaci	05/04/2016
222	I.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_71.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_Abril	10/05/2016
223	I.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_72.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_Abril_2016.pdf	10/05/2016
224	J.1.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_73.- _REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_EJECUTADA_(acreditados_y_reconocidos)_a	09/05/2016
225	J.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_74.- _EVALUACIÓN_IN_SITU_(acreditaciones_y_reconocimientos)_abril_2016.pdf	09/05/2016
226	J.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_75.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_mayo	03/06/2016
227	J.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_76.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_Mayo_2016.pdf	03/06/2016
228	J.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_77.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_junio	08/07/2016
229	J.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_78.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_junio_2016.pdf	08/07/2016
230	J.7.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_79.- _REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_Y_DE_AMPLIACIÓN_EJECUTADA_(I_L_C)_ju	08/07/2016
231	J.8.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_80.- _OEC_ACREDITADOS_Y_RECONOCIDOS_(L_C_I)_Enero_Junio_2016.pdf	08/07/2016
232	J.9.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_81.- _ACREDITACIONES_Y_RECONOCIMIENTO_POR_CAMPO_(L_C_I)_enero_junio_2016.pdf	08/07/2016
233	K.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_83.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_junio_2016.pdf	04/08/2016
234	K.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_84.- _ALERTAS_DE_PRODUCTOS_PELIGROSOS_IDENTIFICADAS_Y_COMUNICADAS_agost	08/09/2016
235	K.4.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_85.- _ALERTAS_PARA_ANÁLISIS_IDENTIFICADAS_agosto_2016.pdf	08/09/2016
236	K.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_86.- _REVISIÓN_DE_SOLICITUDES_INICIALES_EJECUTADA_(acreditados_y_reconocidos)_a	06/09/2016
237	K.6.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_87.- _EVALUACIÓN_IN_SITU_(acreditaciones_y_reconocimientos)_agosto_2016.pdf	06/09/2016
238	L.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_95.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Enero_201	15/02/2016
239	L.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_95.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Febrero_20	09/03/2016
240	L.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_95.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Marzo_20	07/04/2016
241	L.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_95.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Abril_2016	11/05/2016
242	L.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_95.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Mayo_201	08/06/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
243	L.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_95.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Junio_2016	08/07/2016
244	L.5.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_95.- REPORTE_REVISIÓN_DE_CERTIFICADOS_DE_PRODUCTOS_IMPORTADOS_Agosto_2016	12/09/2016
245	M.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_101.- LISTAS_DE_CAPACITACIONES_Y_DE_ASISTENCIAS_(III_Fase_capacitación_nuevos_e	12/07/2016
246	M.2.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_101.- LISTAS_DE_CAPACITACIONES_Y_DE_ASISTENCIAS_(III_Fase_capacitación_nuevos_e	12/07/2016
247	M.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_102.- ACTAS_DE_REUNIÓN_LISTA_DE_USUARIOS_EJECUCIÓN(III_Fase_promover_el_interés	03/03/2016
248	M.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_102.- LISTA_DE_ASISTENCIA_NORMA_17025_LISTA_DE_USUARIOS(III_Fase_promover_el	07/04/2016
249	M.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_102.- ACTAS_DE_REUNIÓN_LISTA_DE_USUARIOS_Y_DE_ASISTENCIA_CURSO(III_Fase	09/05/2016
250	M.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_102.- INFORME_REUNIÓN_LISTA_DE_USUARIOS_ACTAS(III_Fase_promover_el_interés	03/06/2016
251	M.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_102.- LISTA_DE_USUARIOS_INFORME(III_Fase_promover_el_interés_OEC)_jun_2016.pdf	05/07/2016
252	M.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_102.- ACTAS_LISTA_DE_USUARIOS(III_Fase_promover_el_interés_OEC)_agos_2016.pdf	12/09/2016
253	M.3.pdf	ASOCIACIÓN_HITO_102.- ACTA_DE_REUNIÓN_ARMADAEJECUCIÓN(III_Fase_promover_el_interés_OEC)_ene_2016	11/02/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Albuja González, René Fabián	Analista Senior en Presupuesto	Analista Senior en Presupuesto	ralbuja@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Azas Manzano, Marlon Fabricio	Analista de Desarrollo de Software	Analista en Desarrollo de Software 2	mazas@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Baca Terán, Patricia Elizabeth	Analista de Ensayos	Analista de Ensayos 2	pbaca@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Blanc Villacreses, Walther Yandry	Chofer	Chofer	wblanc@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Boada Monge, Miguel Angel	Evaluador de Inspección	Evaluador de Inspección 3	mboada@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Cabezas Chaguamate, Iliana Elizabeth	Analista de Talento Humano	Analista de Talento Humano 2	icabezas@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Cadena Mera, Santiago Vinicio	Analista de Talento Humano	Analista de Talento Humano 1	scadena@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Carrión Granda, Israel	Evaluador Senior en Laboratorios de Calibración	Evaluador Senior en Laboratorios de Calibración	icarrion@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Castellanos Hernández, Patricia Alexandra	Asistente de Laboratorios	Asistente de Laboratorios 2	pcastellanos@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Cevallos Bermeo, Aleida Gisell	Asistente Técnico	Asistente Técnico	acevallos@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Gaibor Yagchirema, Luis Fernando	Asistente de Facturación	Asistente de Facturación	lgaibor@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Giler Hernández, Mariana de los Angeles	Asistente Zonal	Responsable Zonal (Zona 8)	mgiler@acreditacion.gob.ec	
Macas Palacio, Yovana Katherine	Especialista en Planificación	Analista de Planificación 3	ymacas@acreditacion.gob.ec	3316610
Martínez Mantilla, Lucía Gabriela	Asistente Administrativo	Asistente Administrativo	lmartinez@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Maya Izurieta, Néstor Xavier	Líder de Proyecto	Especialista en Gestión de Calidad	nmaya@acreditacion.gob.ec	
Maya Izurieta, Néstor Xavier	Coordinador Administrativo	Especialista en Gestión de Calidad	nmaya@acreditacion.gob.ec	
Medina De La Barra, Milton Andrés	Técnico Auditor de Laboratorio	Técnico Auditor de Laboratorio 2	mmedina@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Mora Arana, Sonia Gabriela	Asistente Administrativo Financiero	Asistente Administrativo Financiero	smora@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Pazmiño Zaldumbide, Mercy Paulina	Especialista de Gestión de la Calidad	Especialista en Gestión de Calidad	ppazmino@acreditacion.gob.ec	
Pérez Villafuerte, Walter Fernando	Experto en Laboratorios	Experto de Laboratorios	wperez@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Raza Acosta, Luis Patricio	Asistente Técnico	Asistente Técnico	praza@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Reyes Benalcázar, Guido	Especialista de Inspección	Especialista de Inspección	greyes@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Rodas Salem, Gloria Elizabeth	Analista Jurídica	Analista Jurídica 3	grodas@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Rodríguez Pólit, Cristina Jeanneth	Analista de Ensayos	Analista de Ensayos 1	crodriguez@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Romo Orbe, Miriam Janneth	Líder Técnico	Directora de Certificación	rmromo@oea.gob.ec	
Ruiz Pozo, Jorge Estuardo	Patrocinador Ejecutivo	Director Ejecutivo (E)	eruiz@oea.gob.ec	
Salazar Román, Manuel Mesías	Analista en Calibración	Analista en Calibración 2	msalazar@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Terán Guerrero, Andrea Estefanía	Analista en Gestión de la Calidad	Analista de Gestión de la Calidad	ateran@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Utreras López, Tomás	Analista de Servicios Generales	Analista de Servicios Generales 2	tutreras@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Vallejo Vera, Jorge Luis	Analista de Inteligencia Comercial	Analista de Inteligencia Comercial	jvallejo@acreditacion.gob.ec	
Vera Marquez, Apolinar Pedro	Mensajero	Mensajero	avera@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Vinueza Stacey, Paúl Andrés	Analista de Comunicación	Analista de Comunicación Social 1	pvinueza@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Vivanco Tomalá, Fernando David	Mensajero	Mensajero	dvivanco@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Yacelga De La Torre, Carlos Paolo	Especialista en Infraestructura y Seguridad	Especialista en Infraestructura y Seguridad	cyacelga@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
Yépez Carpio, Darwin Alexander	Analista de Certificación de Productos	Analista de Certificación de Productos 2	dyopez@acreditacion.gob.ec	(02) 331-6120
